

오 탁 방 지 막 시 공 계 획 서

공 사 명	
제 출 일	

(회 사 명)

목 차

I. 시 공 계 획

1. 공사개요
2. 예정공정표
3. 조직도
4. 시공 흐름도
5. 공종별 시공계획
6. 인원 · 장비 · 자재 투입계획
7. 오탉방지막 문제점 및 대책 검토안

II. 품 질 관 리

III. 환경 · 안전관리계획

1. 시 공 계 획

1. 공사개요

본 공사는 ○○ 공사 기간 중 준설과 기초공사로 생기는 오탁수와 부유물질이 퍼져 바다(하천)가 오탁되는 것을 막기 위하여 오탁방지막을 설치하는 공사입니다.

막 한 장(1 SPAN) 길이		20m	앵커 간격 · 줄 수		10m 간격	2줄
구 분	연 장	오탁방지막	달가지형 앵커	비 고		
합 계						

※ SPAN = 연장 ÷ 막 한 장 길이(올림) · 앵커 = (연장 ÷ 앵커 간격(올림) + 1) × 줄 수 — 노란 칸은 설계에 맞게 고쳐 씁니다.

※ 오랫동안 설치해 두어 오탁방지막의 평균 수명(2~3년)을 넘기면 다시 설치합니다.

2. 예정공정표 (별첨)

3. 조직도 (별첨)


2. 예정공정표

착 공 일		※ 착공일을 적으면 달 눈금이, 공종마다 착수·완료일을 적으면 막대가 그려집니다.																			
공 종	착 수	완 료																			비 고
			상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	

※ 오랫동안 설치해 두어 오탁방지막의 평균 수명(2~3년)을 넘기면 다시 설치합니다.

3. 조 직 도

직 책	성 명	맡은 일
공사 과장		공사 총괄 · 감독(감리) 협의
작업반 소장		작업 지휘 · 안전
작업반장		작업 배치 · 자재
잠수사		수중 설치 · 점검
잠수사		수중 설치 · 점검
특별인부		육상 조립 · 운반 보조

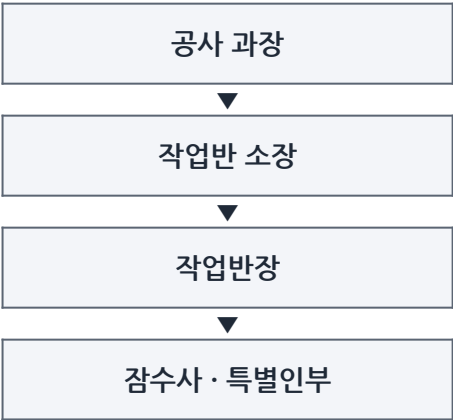

4. 시공 흐름도



5. 공종별 시공계획

5.1 준비공

공사 착수 전 설치 구간의 수심·조류·항로와 주변 어장·시설을 조사하고, 오탐방지막 설치 위치와 방법을 정해 감독(감리)의 승인을 받은 뒤 작업합니다.

5.2 재료 반입

1) 품질 기준

오탐방지막은 물속과 햇빛에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 투수성·여과성이 좋아 물속의 흙탕물이 퍼지는 것을 막을 수 있는 재료를 씁니다.

2) 오탐방지막 구조 및 형상

- ① 막체는 운반과 설치가 쉬워야 하고, 이음부는 보강 벨트를 두 겹으로 댑니다.
- ② 조류·파랑에도 막체가 말려 올라가거나 뒤틀리지 않고 주름 없는 평면 모양을 유지해 오탐이 퍼지는 것을 막습니다.
- ③ 막체와 막체, 막체와 부자재(부체·체인·샤클)는 단단히 연결합니다.
- ④ 앵커(닻)는 조류·조위·파랑에 막체가 밀리지 않게 붙잡을 수 있는 크기로 하고, 앵커와 막체를 잇는 와이어로프는 이 힘을 견디는 강도로 합니다.

3) 막체의 재질 및 성능 — 직포 토목섬유 성능 기준

종류	형별	중량 (g/m ²)	인장강도 (kg/in)	인장신도 (%)	봉합강도 (kg/in)	투수계수 (cm/sec)	비중	인열강도 (kg)	재질	수축률 (%)
오탐방지막	25형	700 이상	635 이상	10 ~ 30	635 이상	$\alpha \times 10^{-2} \sim -4$ (α : 1~9)	1.0 이상	250 이상	Poly- ester	±0.2 이하

※ 시험성적서를 감독(감리)에 내고 승인을 받은 뒤 씁니다.

4) 부속재료

부속재료는 바닷물에 부식되지 않는 재질로 하고, 조류에 풀리거나 떨어져 나가지 않는 구조로 만듭니다.

부자재	재질	규격	용도
부체	Polystyrene	φ300×835×1/2	비중 0.016 이상으로 부력 유지
부체 커버	Polystyrene	φ310×840×1/2	부체 보호용 — 외부 충격에 견디고 내한성·내구성이 좋은 재질
부체 밴드	SUS	30×480	부체 결합용 — 부식되지 않는 스테인리스
볼트·너트	Brass	5/16"×1 1/4"	부체 연결용 — 부식되지 않는 황동
보강 벨트	Polyester	60mm	단위 제품(20m) 사이 원단 이음부·강도 보강부에 부착
샤클	SS400 Zn도금	φ14 · φ20	제품 사이 연결용 — 조류에 풀리지 않게 스플릿 핀을 끼우는 S.B 타입, 아연도금
보강 금구	SS400 Zn도금	60×150	보강 벨트 위 샤클 연결부 보강용 — 부식 방지 아연도금
구멍쇠	Brass	φ20	제품 이음부와 하부 체인 연결용 — 부식으로 막체가 상하지 않게
링크	Brass	φ7	체인 연결용
체인	Steel	φ16	막체가 주름지지 않게 누르는 추 — 제품 폭에 따라 고름

5) 오탉방지막 보관

막체는 햇빛(자외선)을 오래 받으면 강도가 떨어질 수 있으므로 창고에 보관하고, 밖에 둘 때는 천막 등으로 덮어 바람·비·햇빛을 막으며, 시공 직전에 꺼내 씁니다.

5.3 시공 방법

- 1) 측량 — 설계도면에 따라 기점·꼭지점·종점 등 설치 위치를 측량한 뒤 부표를 띄워 위치를 표시합니다.
- 2) 자재가 들어오면 육상에서 40 ~ 50 SPAN 씩 완전히 조립해 두고, 바다로 옮기기 쉽게 배치합니다.
- 3) 해상의 기점·꼭지점·종점과 각 위치에 잠수사를 투입해 정해진 앵커(닻)를 심습니다.
- 4) 기점에 앵커가 설치되고 오탉방지막이 약 30 SPAN 씩 조립되어 준비가 끝나면, 예선(150HP)을 대어 조립된 막을 바다로 끌어냅니다.
- 5) 끌어낸 오탉방지막은 P.P 로프로 가설치합니다.
- 6) 앵커는 육상에서 크레인(25톤)으로 바지(5m×5m)에 실어 나릅니다.
- 7) 3)~5)와 같은 방법으로 가설치를 마치면 설계도면과 같게 10m 간격으로 앵커를 설치하고, 와이어와 부속자재를 단단히 체결합니다.

6. 인원 · 장비 · 자재 투입계획

6.1 작업인원 투입계획

직 종	단위	일투입	투입일수	누 계	작 업 내 용
관리	인				현장 기술지도 및 안전관리
반장	인				현장관리 및 작업관리
잠수사	인				오탉방지막 설치 및 닻 설치
특별인부	인				오탉방지막 설치 및 닻 설치
계					

6.2 장비 투입계획

장 비 명	규 격	단위	일투입	투입일수	누 계	비 고
바지(PONTOON)	5m×5m	대				
예선	150HP	대				
작업선	모터보트	대				
크레인	25톤	대				
카고트럭	11톤	대				
계						

6.3 자재

오탉방지막(막체) · 부체 · 체인 · 샤클 · 앵커(닻) · 와이어로프 — 수량은 1. 공사개요의 SPAN 수와 앵커 수를 따릅니다.

※ 작업 인원과 장비 투입은 현장 여건과 투입 날짜에 따라 바뀔 수 있습니다. 누계 = 일투입 × 투입일수.

II. 품 질 관 리

- 1) 오탉방지막은 물속과 햇빛에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 투수성이 좋으며 오탉 확산을 막을 수 있는 재료로 합니다.
- 2) 오탉방지막은 성능 기준표(5.2의 3))의 규격을 만족해야 합니다.
- 3) 오탉방지막은 시험성적서를 감독(감리)에 내고 승인을 받은 뒤 씁니다.
- 4) 설치할 때 막체가 찢어지거나 상하지 않도록 품질관리에 힘씁니다.

III. 환경 · 안전관리계획

- 1) 새로 들어온 근로자는 건강진단과 신규 채용 교육(1시간 이상)을 받은 뒤 작업에 들어갑니다.
- 2) 매일 작업 전 안전조회로 건강 상태를 확인한 뒤 배치합니다.
- 3) 앵커(닻)는 무거우므로 운반·설치 때 끼임과 허리 부상에 특히 주의합니다.
- 4) 안전관리 책임자는 늘 일기예보를 확인하고, 날씨가 나빠지면 자재를 육상의 안전한 곳으로 옮깁니다.
- 5) 물 위에서 일할 때는 구명조끼를 입습니다.
- 6) 잠수사는 작업 전에 충분히 준비운동을 합니다.
- 7) 작업 중 기름 등으로 바다가 오염되지 않도록 특히 주의합니다.
- 8) 작업 중 생긴 폐기물은 법에 정한 절차대로 처리합니다.

해상작업 중지 기준	파고	1.0m 이상	유속	1.0m/s 이상
------------	----	---------	----	-----------

※ 노란 칸은 현장·발주기관 기준에 맞게 고쳐 씁니다.
